Nome Fase\Descrizione	Durata	Inizio	Fine	Area	N. squadre	Comp. squadre
Diagramma di Gantt		22/09/2025	23/12/2025			2
Allestimento cantiere	2/2	22/09/2025	23/09/2025	AREA ESTERNA	1	2
Delimitazione lavori	2/2	24/09/2025	25/09/2025	Intero cantiere	1	2
Approvvigionamento del materiale	3/5	26/09/2025	30/09/2025	AREA ESTERNA	1	2
Rimozione di infissi interni	2/2	01/10/2025	02/10/2025	REPARTO RM	1	3
Demolizione di controsoffitti	3/5	03/10/2025	07/10/2025	Intero cantiere	1	3
Demolizione di murature a mano	1/1	08/10/2025	08/10/2025	SALA RM	1	4
Rimozione di impianti	3/5	09/10/2025	13/10/2025	Intero cantiere	1	2
Installazione apparecchiature elettriche	6/8	13/10/2025	20/10/2025	Intero cantiere	1	2
Impianto di climatizzazione completo	2/2	20/10/2025	21/10/2025	Intero cantiere	1	2
Installazione impianto di messa a terra	3/3	22/10/2025	24/10/2025	SALA RM	1	2
Posa cavi e conduttori	3/5	24/10/2025	28/10/2025	Intero cantiere	1	2
Muratura in mattoni semipieni	2/2	22/10/2025	23/10/2025	SALA RM	1	4
Posa di canalette portacavi edifici abitativi	3/3	29/10/2025	31/10/2025	SALA RM	1	2
Posa delle tubazioni	2/4	31/10/2025	03/11/2025	Intero cantiere	1	2
Divisori con blocchi di gesso o latergesso	4/6	29/10/2025	03/11/2025	SALA RM	1	3
Montaggio controsoffitti in cartongesso	5/5	03/11/2025	07/11/2025	Intero cantiere	1	2
Montaggio controsoffitti metallici	2/4	07/11/2025	10/11/2025	SALA RM	1	2
Rivestimenti interni verticali ed orizzontali in legno	2/2	11/11/2025	12/11/2025	SALA RM	1	4
Pavimentazioni epossidici vinilici o artistici	2/2	13/11/2025	14/11/2025	SALA RM	1	2
Lavori su quadri elettrici	3/5	14/11/2025	18/11/2025	Intero cantiere	1	2
Montaggio infissi interni in metallo	3/3	18/11/2025	20/11/2025	REPARTO RM	1	3
Lavori in prossimità di parti elettriche in tensione	4/6	20/11/2025	25/11/2025	Intero cantiere	1	2
Rimozione di infissi interni/ Montaggio Infissi Interni	2/2	27/11/2025	28/11/2025	REPARTO RM	1	3
Tinteggiatura di pareti e soffitto a spruzzo	4/4	01/12/2025	04/12/2025	Intero cantiere	1	2
Pareti mobili	3/3	09/12/2025	11/12/2025	REPARTO RM	1	2
Montaggio Nuove Unità Esterne trattamento Aria	6/8	24/11/2025	01/12/2025	AREA IN COPERTURA	1	2
Trasporto e smaltimento materiali di rifiuto non pericolosi	3/5	11/12/2025	15/12/2025	AREA ESTERNA	1	2
Pulizia e smantellamento Cantiere	4/4	15/12/2025	18/12/2025	Intero cantiere	1	2
Smobilizzo cantiere	1/1	19/12/2025	19/12/2025	AREA ESTERNA	1	2
COLLAUO IMPIANTI	2/2	22/12/2025	23/12/2025	REPARTO RM	1	3

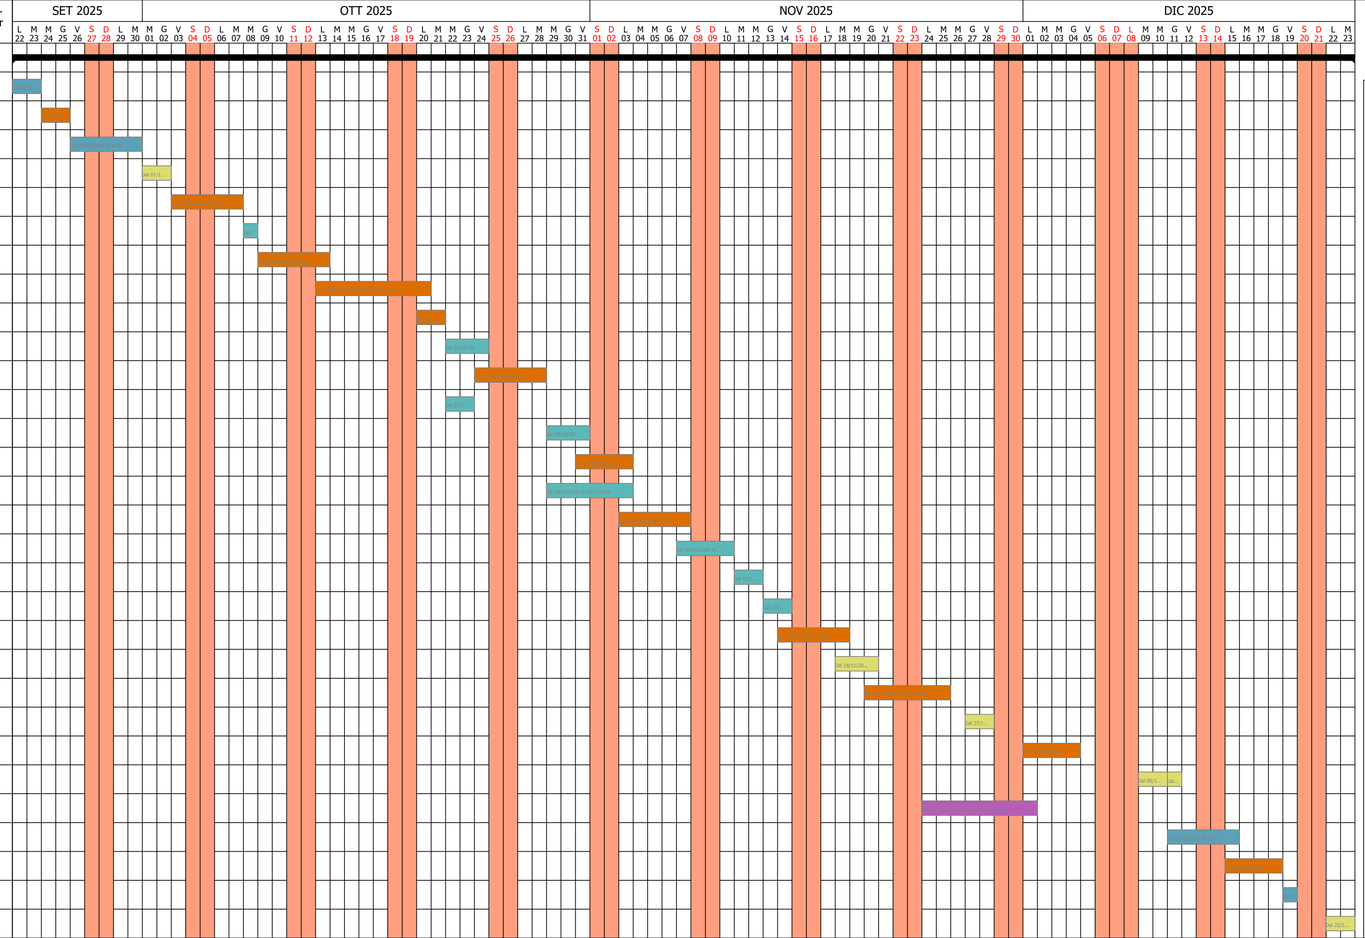

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Ministero della Salute

Italiadomani – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL8 CAGLIARI
Azienda socio-sanitaria locale
Sede Legale
Ospedale Marino, Viale Lungomare Poetto n. 12, Cagliari
Sede operativa
Cittadella della Salute, via Romagna n. 16, PAD. H, Cagliari
Telefono: 070 6097602 - 070 6097909
mail: direzione.generale@aslcagliari.it

ARES SARDEGNA
Azienda Regionale Salute
via Piero della Francesca n. 1
09047 Selargius (CA)
cod. fisc. / P. Iva 03909570925

PNRR - Missione 6 salute, Component 2 – Investimento 1.1.
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, Sub-intervento 1.1.2 Grandi Apparecchiature.
CUP B24E22000220006

STRUTTURA:
P. O. Marino
Viale Poetto 12, CAGLIARI

ASL n.8 Cagliari
Struttura Complessa
Ufficio Tecnico e Patrimonio
sede operativa
Cittadella della Salute, via Romagna n. 16, PAD. H, Cagliari
pec: servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

INTERVENTO:
Lavori di adeguamento locali per installazione di: RM P.O. Marino

ALLEGATO 15

rev 0 Luglio 2025

progetto definitivo esecutivo

Il Progettista
Ing. Francesco Moi

Diagramma di Gantt

Il Responsabile della fase di progettazione	Il dirigente delegato di SC Ufficio Tecnico e Patrimonio	
Ing. Mario Osvaldo Areddu	**Ing. Fabio Francesco Farci**	MOI FRANCESCO 17.07.2025 13:27:15 GMT+02:00
MARIO OSVALDO AREDDU 17.07.2025 14:05:57 GMT+02:00		
Il Responsabile Sicurezza RMN	Il Direttore Dip. Radiologia	Il Direttore Generale
Dott.ssa Marianna Loi	**Dott. Stefano Marcia**	**Dott. Aldo Atzori**
